

第16回熊本市液状化対策技術検討委員会 説明資料 【近見地区】

【報告1 事業の経過・今後の予定について】

熊本市

令和4年11月24日

報告 1 事業の経過・今後の予定について

報告 1

【事業の経緯】

2016(平成28)年度
 ・平成28年熊本地震の発生

2017(平成29)年度
 ・「熊本市液状化対策技術検討委員会」の設立

2018(平成30)年度
 ・実証実験の実施
 ・④地区の工事着手

2019(令和元)年度
 ・②⑥地区の工事着手

2020(令和2)年度
 ・④地区の地下水位低下開始
 ・①⑦⑧地区の工事着手


2021(令和3)年度
 ・④地区の地下水位低下完了
 ・③⑤地区の工事着手(全地区の工事着手)
 ・⑥地区の地下水位低下開始

2022(令和4)年度
 ・⑦⑧地区の地下水位低下開始

【事業の進捗状況(2022年(令和4年)10月末現在)】

地区	面積	現状	工事進捗率
①	3ha	地下水位低下中	100%
②	8ha	工事中	95%
③	9ha	工事中	80%
④	1ha	地下水位低下完了	100%
⑤	6ha	工事中	80%
⑥	2ha	地下水位低下中	100%
⑦	3ha	地下水位低下中	100%
⑧	3ha	工事中	90%
計	35ha	-----	85%

【対策工事 各地区の施工予定スケジュール】

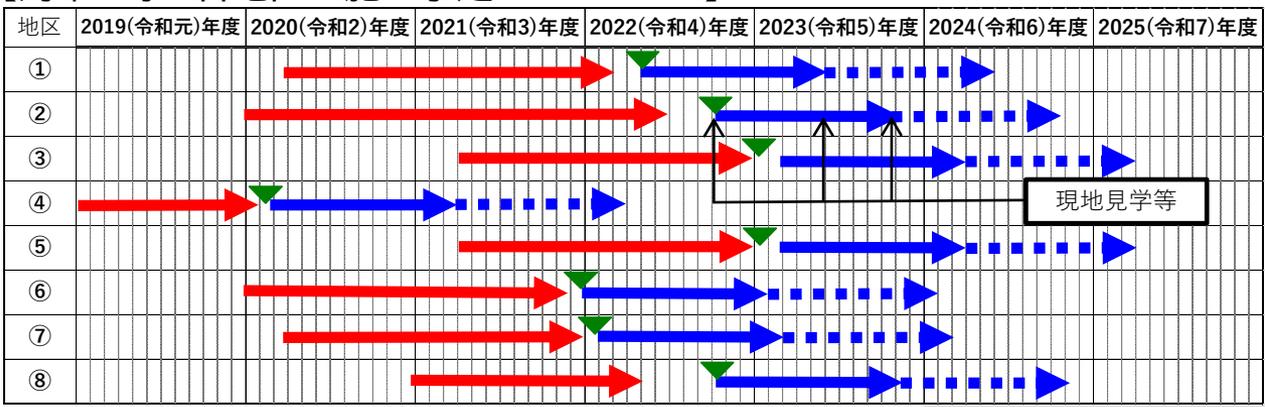

費目	金額(億円)
工事費	約100
委託費	約25

