




- 地域の皆さまにおかれましては、日頃より「国道3号 植木バイパス」の工事にご協力いただき誠にありがとうございます。
- 植木バイパスの3工区【整備中区間】においては、早期開通を目指し、現在「^{あぶみだ}鐙田地区」「^{かのこぎ}鹿子木地区」の工事を進めています。
- 本工事等の進み具合について、広く情報発信するため、『工事通信』にてご紹介していきます。

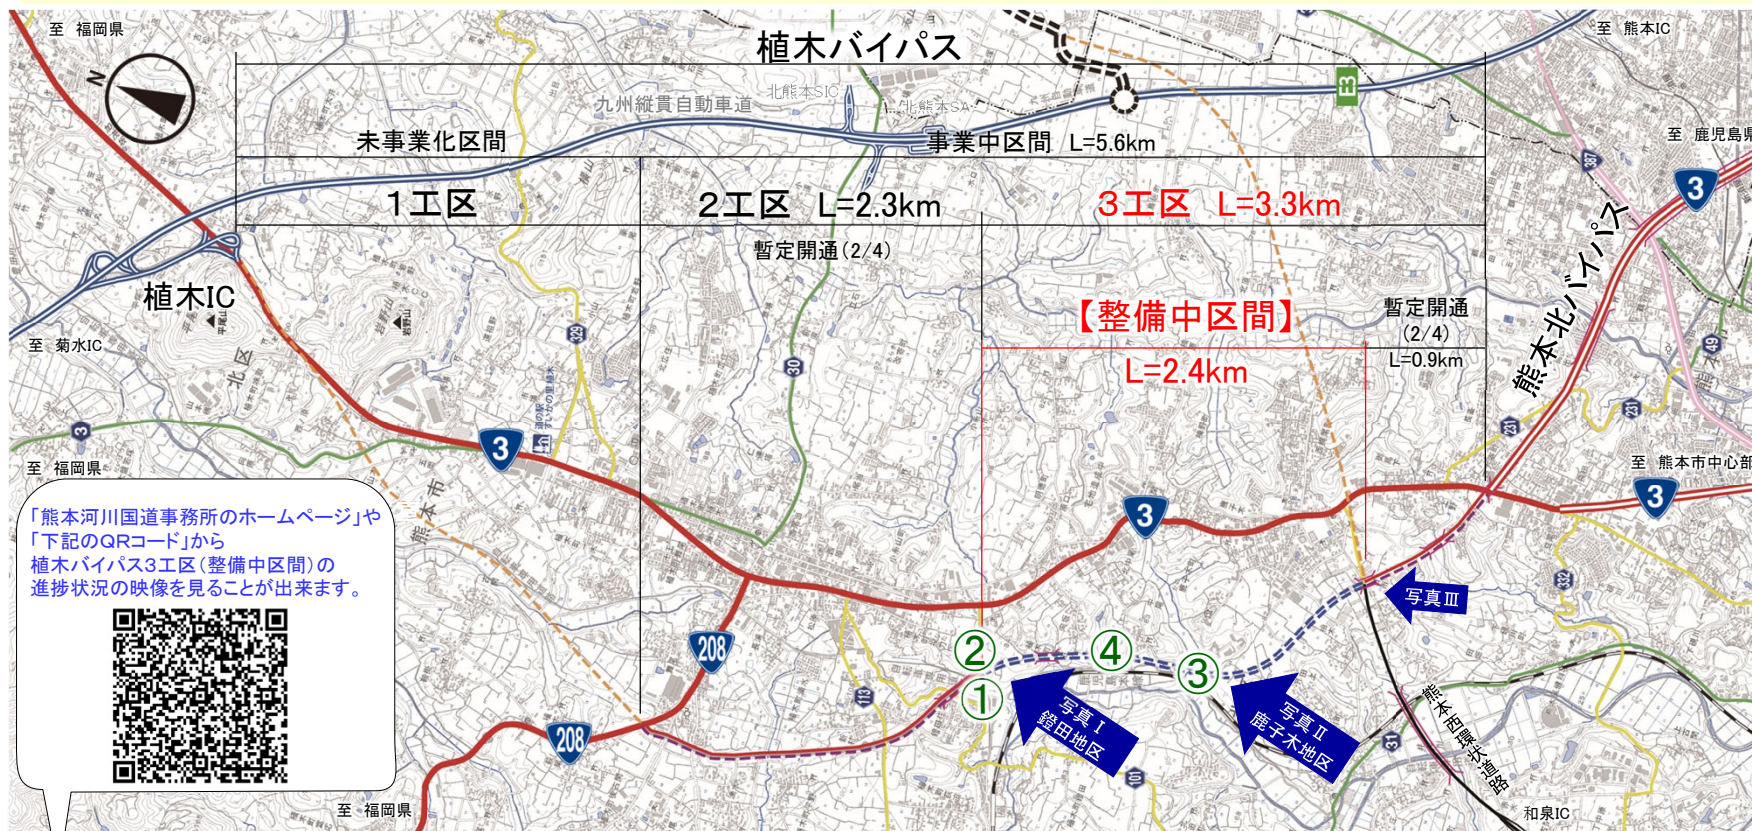

① 熊本3号 植木バイパス外改良
(その2)工事 (R7.4.1~R8.2.27)

- 1)五領建設(株)
- 2)地盤の改良
- 3)地盤の改良



現場代理人の段原です。9月は地盤改良の施工を行っていきます。
重機災害防止に努めて、安全第一で作業を進めてまいります。



② 熊本3号 鐙田地区改良6期工事
(R7.6.2~R8.3.27)

- 1) 三洲建設(株)
- 2) コンクリートボックスの設置
- 3) コンクリートボックス工場製作



現場代理人の永友です。
9月もコンクリートボックスの
工場製作を進めてまいります。



③ 熊本3号 鹿子木地区改良7期工事
(R7.4.1~R8.2.27)

- 1) 興亜建設工業(株)
- 2) 地盤の改良、道路本体の盛土
- 3) 路体盛土・迂回路掘削



現場代理人の松本です。9月は土砂搬・路体盛土・迂回路掘削を行います。地元車優先で安全第一で工してまいります。



④ 熊本3号 植木バイパス外改良
(その3)工事 (R7.7.22~R8.3.19)

- 1) 諫山工業(株)
- 2) 地盤の改良
- 3) 除草 (硯川地区、滴水地区)



現場代理人の川元です。9月は現場
周辺で除草を実施し、安全で快適
環境づくりを進めてまいります。
ご協力をお願いいたします。



- 【凡例】
- 1) 受注者名
 - 2) 主な工事内容
 - 3) 現在の工事状況



植木バイパス 3工区【整備中区間】

航空写真



写真IV



写真V



写真VI



埋蔵文化財調査の状況




埋蔵文化財調査の状況





九州地方整備局 熊本河川国道事務所 あぶみだ 植木バイパス「鑑田地区」

- 鑑田地区においては、弱い地盤を強くする**地盤改良工事**と市道の機能を確保するための**コンクリートボックス**の工事を進めます。
- 現在は、現地の地盤改良などを行っています。

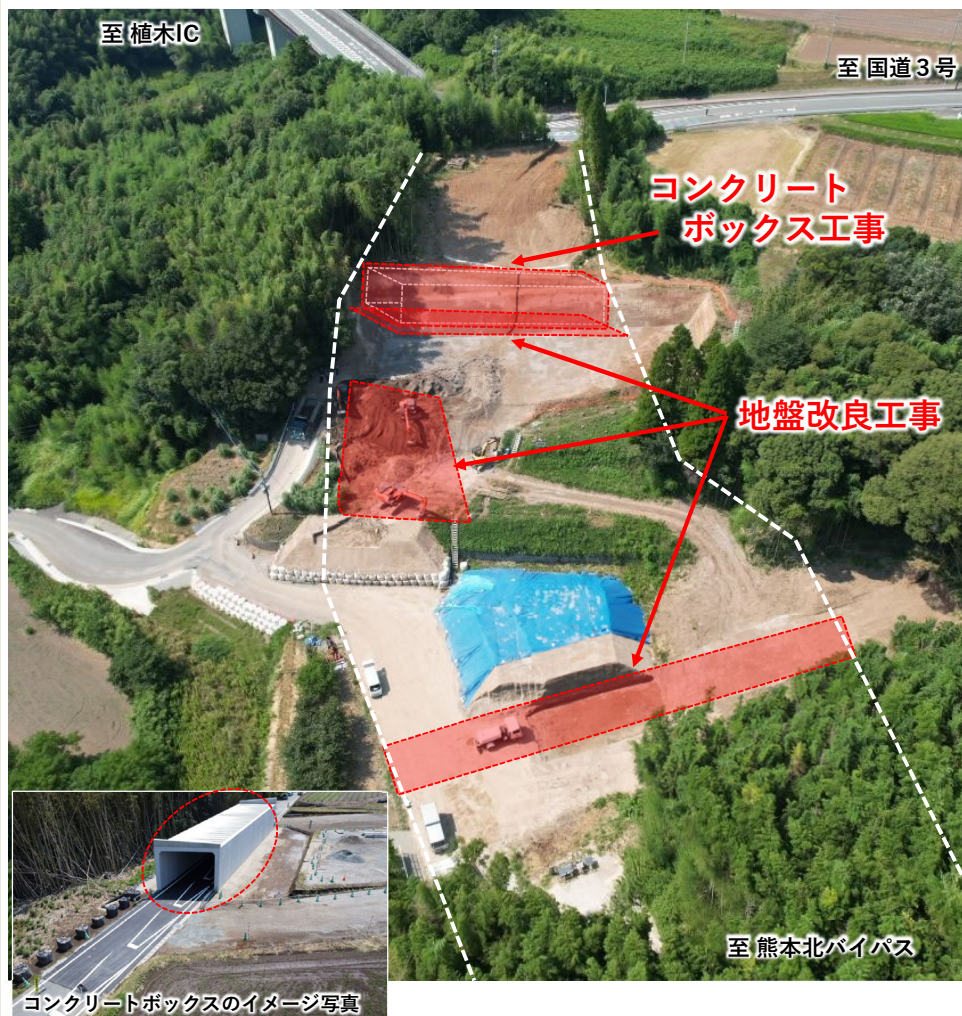


- 現地では掘削作業が完了し、地盤改良がスタートしました。
- 地盤改良は、バックホウの先端に取り付けたグルグル回るスクリューで、弱い地盤にセメントミルクを混ぜて地盤を強くします。
モニターには地盤改良の状況が表示されます。
- 工場製作中のコンクリートボックスは鉄筋を組み立てる作業を行っています。



現場に咲いていた♡かわいい♡お花たち



ツククサ



ヒメジョオン



オニタビラコ



～今月の工事通信は、わたしが作成しました！～

九州地方整備局 熊本河川国道事務所 神蘭（かみぞの）です。
今年の4月から植木バイパス担当の建設監督官として仕事をしています。
植木バイパスの1日も早い開通を目指してがんばっています！






九州地方整備局 熊本河川国道事務所

かのこぎ

植木バイパス「鹿子木地区」

- 鹿子木地区においては、**道路本体の盛土工事**とコンクリートボックスを施工するための**市道の迂回路工事**を進めています。
- 現在は、道路本体の盛土工事や補強土壁の工事などを行っています。

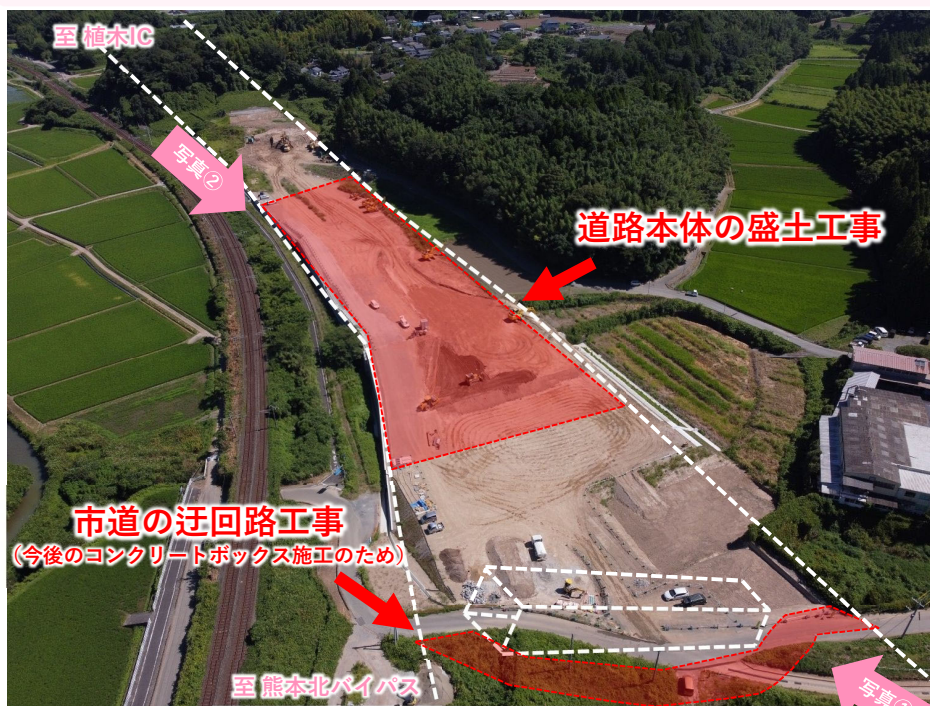

コンクリートボックスのイメージ写真



写真①


道路本体の盛土工事の状況

- 現地では補強土壁を施工しています。補強土壁は盛土の中に鉄などの補強材を挿入しコンクリートなどの壁面材と組み合わせることで、垂直に土を盛ることができます。
- 片側交互通行となっていた市道迂回路部の付替水路工事は、無事に縦排水工の施工が完了しました。ご協力ありがとうございました。




写真②

補強土壁

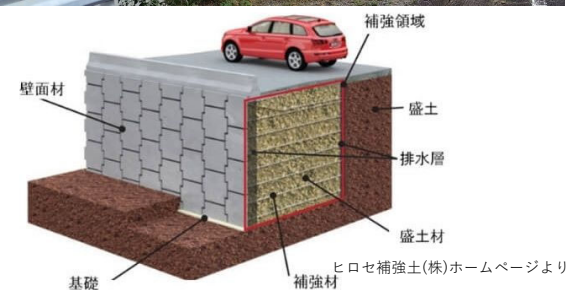


縦排水工の完了

現場に咲いていた♡かわいい♡お花たち



シロツメグサ



ノアズキ



ガガイモ

～今月の工事通信は、わたしが作成しました！～

九州地方整備局 熊本河川国道事務所 神園（かみそ）です。
今年の4月から植木バイパス担当の建設監督官として仕事をしています。
植木バイパスの1日も早い開通を目指してがんばっています！

