

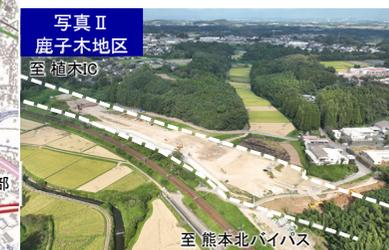


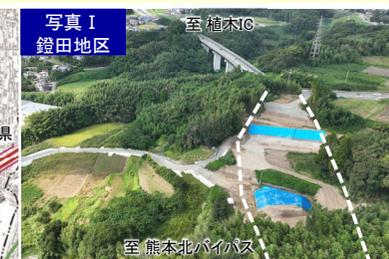

- 地域の皆さまにおかれましては、日頃より「国道3号 植木バイパス」の工事にご協力いただき誠にありがとうございます。
- 植木バイパスの3工区【整備中区間】においては、早期開通を目指し、現在「^{あぶみだ} 鏡田地区」「^{かのこぎ} 鹿子木地区」の工事を進めています。
- 本工事等の進み具合について、広く情報発信するため、『工事通信』にてご紹介していきます。

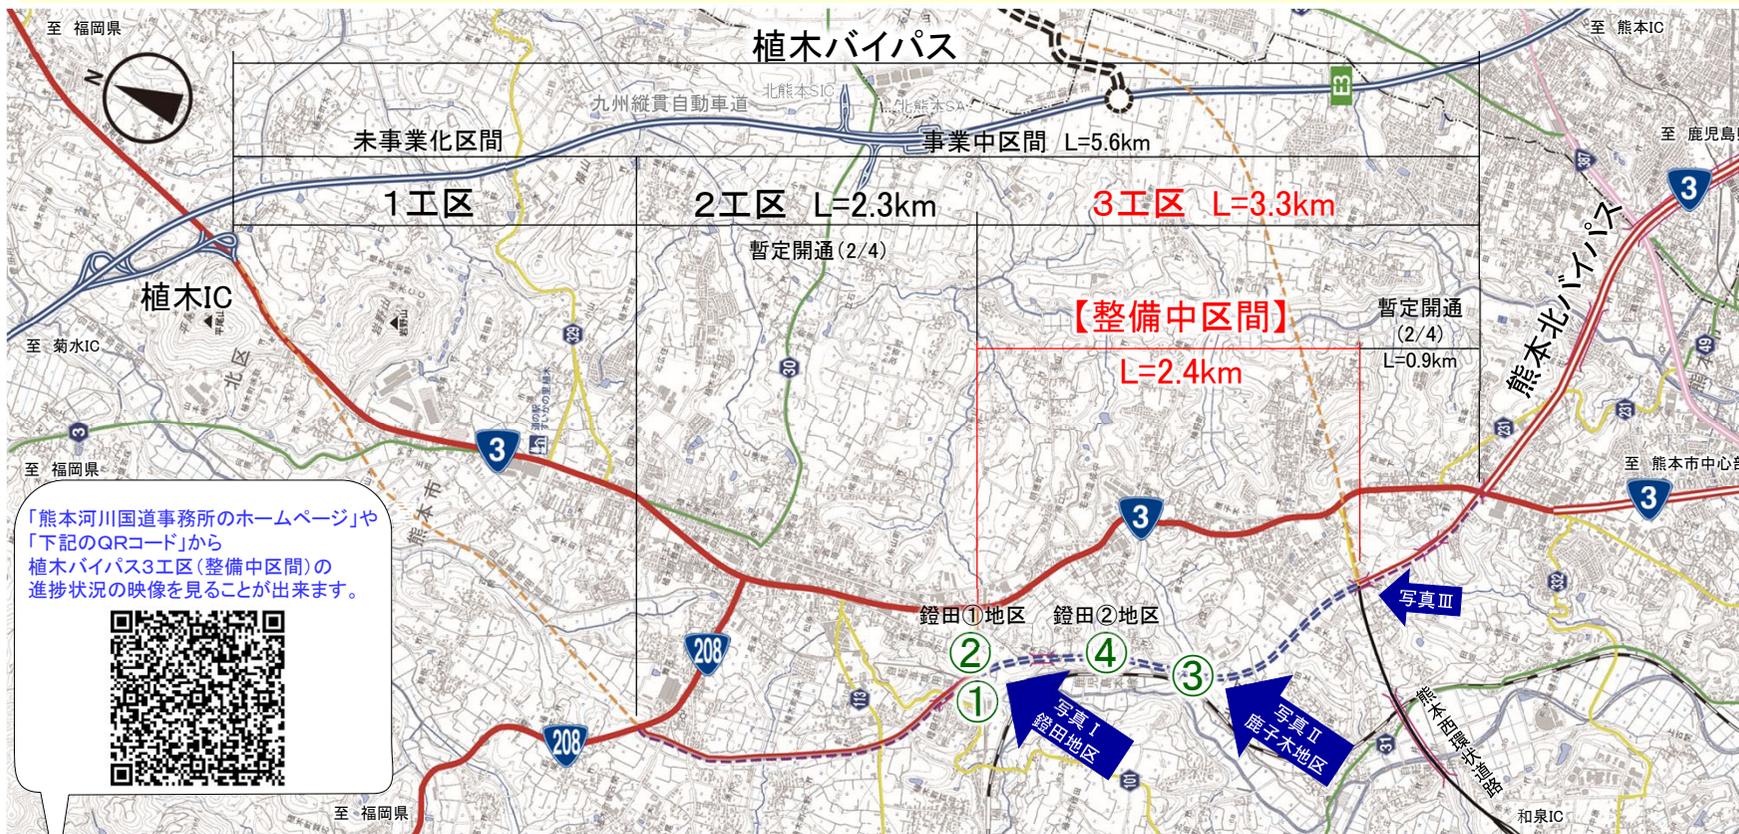

① 熊本3号 植木バイパス外改良 (その2) 工事 (R7.4.1~R8.2.27)

- 五領建設(株)
- 地盤の改良
- 伐採工

現場代理人の段原です。2月は竹林の伐採を行っています。工事完了まで安全第一で作業を進めてまいります。

② 熊本3号 鏡田地区改良6期工事 (R7.6.2~R8.3.27)

- 三洲建設(株)
- コンクリートボックスの設置
- 底版工・地覆工

現場代理人の永友です。1月で底版工、地覆工が完了し、2月は足場解体を行います。工事完了まで気を引き締めて安全第一で努めてまいります。

③ 熊本3号 鹿子木地区改良7期工事 (R7.4.1~R8.2.27)

- 興亜建設工業(株)
- 地盤の改良、道路本体の盛土
- 道路付属物工

現場代理人の松本です。2月は付属物の施工を行います。最後まで地元の方に迷惑が無いように、安全第一で施工してまいります。

④ 熊本3号 植木バイパス外改良 (その3) 工事 (R7.7.22~R8.3.19)

- 諫山工業(株)
- 地盤の改良
- 土質改良・路体盛土

現場代理人の川元です。寒さが続く時期ですが、安全に配慮し、丁寧な作業を心がけて進めてまいります。



植木バイパス 3工区【整備中区間】

航空写真



写真V



写真VI



写真IV



埋蔵文化財調査の状況





九州地方整備局 熊本河川国道事務所

あぶみだ

植木バイパス「鏡田地区」


●鏡田①地区においては、市道の機能を確保するための**コンクリートボックス**の工事を進めています。

●1月で底版コンクリートの施工が完了しました。



●鏡田②地区においては、弱い地盤を強くする**地盤改良工事**、**道路本体の盛土工事**を行っています。

●道路本体の盛土工事は、軟弱な土を土質改良しながら進めています。

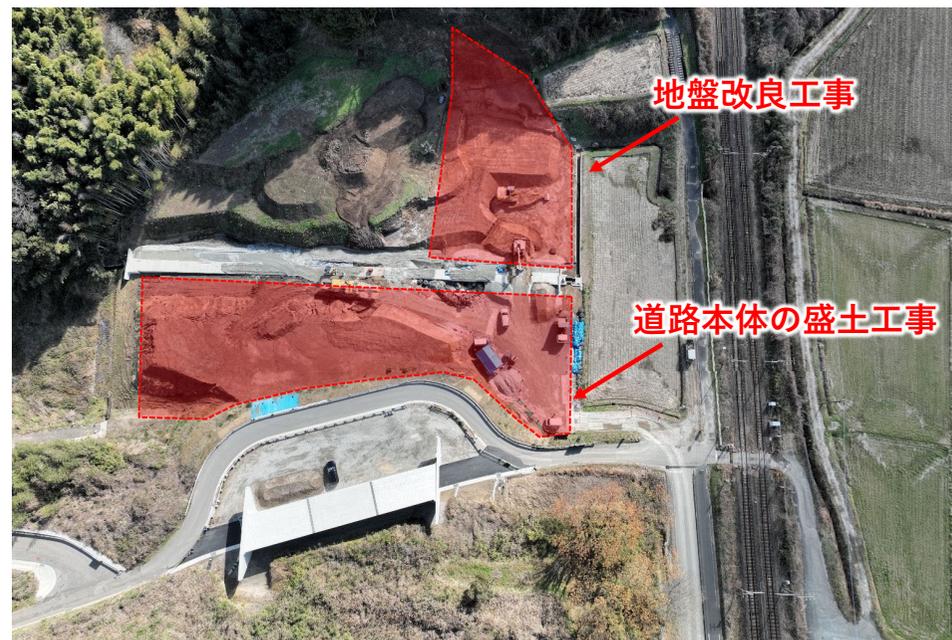

現場で見つけた♡かわいい♡お花たち



シロバナタンポポ



ノイバラの実



ホトケノザ



～今月の工事通信は、わたしが作成しました！～

九州地方整備局 熊本河川国道事務所 神園 (かみぞの) です。
植木バイパス担当の建設監督官として仕事をしています。
植木バイパスの1日も早い開通を目指してがんばっています！





九州地方整備局 熊本河川国道事務所

かのこぎ

植木バイパス「鹿子木地区」

- 鹿子木地区においては、**道路本体の盛土工事**とコンクリートボックスを施工するための**市道の迂回路工事**を進めています。
- 本工事での道路本体の盛土工事は、排水構造物工、植生工含めて完了し、現在は市道迂回路の工事を進めています。



市道の迂回路工事の状況



市道の迂回路工事の状況

- コンクリートボックスを施工するための市道迂回路の工事においては、1月に舗装工事を行いました。現在の市道に擦り付ける必要があったため市道を全面通行止めし、表層を夜間に施工しました。地元の皆様には通行止めにご協力いただき、ありがとうございました。



写真③

コンクリートボックス (今後施工)

市道の迂回路工事の状況



コンクリートボックスのイメージ写真



舗装 (路盤) の施工状況



舗装 (表層) の施工状況

現場に咲いていた♡かわいい♡お花たち



グレゴマ



ヤブミョウガ



ナズナ



～今月の工事通信は、わたしが作成しました！～

九州地方整備局 熊本河川国道事務所 神園 (かみその) です。
 植木バイパス担当の建設監督官として仕事をしています。
 植木バイパスの1日も早い開通を目指してがんばっています！

