


●鹿子木地区における**道路本体の盛土工事**（今回工事分）とコンクリートボックスを施工するための**市道の迂回路工事**については、2月末で完了しました。



●3月から、鹿子木地区と鏡田地区に跨り、**道路本体の切土・盛土工事**を進めていきます。

●現在は準備工として、除草・伐採等を行っています。

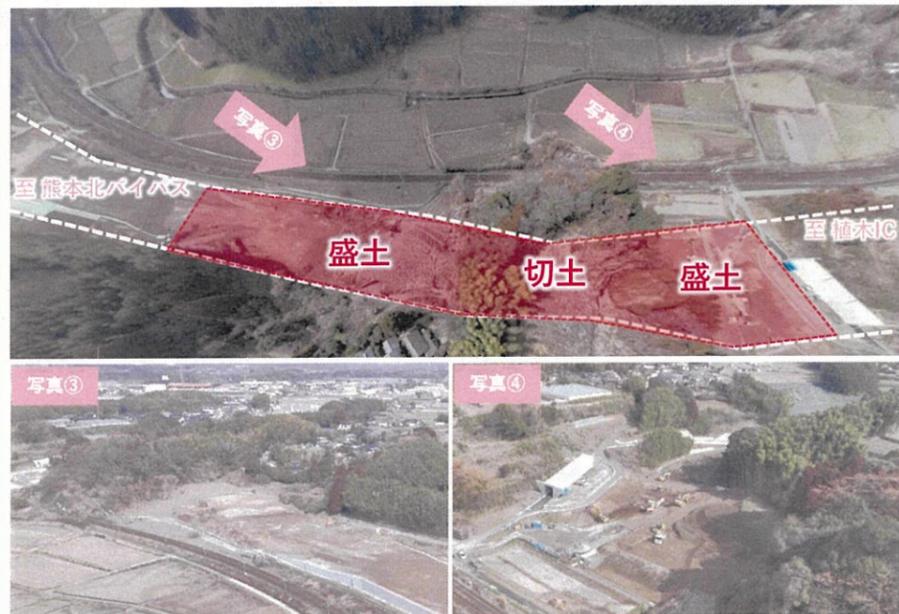

現場に咲いていた♡かわいい♡お花たち



ホトケノザ



ホトケノザ (白)




～今月の工事通信は、わたしが作成しました！～

九州地方整備局 熊本河川国道事務所 神園 (かみその) です。
植木バイパス担当の建設監督官として仕事をしています。
植木バイパスの1日も早い開通を目指してがんばっています！



- 地域の皆さまにおかれましては、日頃より「国道3号 植木バイパス」の工事にご協力いただき誠にありがとうございます。
- 植木バイパスの3工区【整備中区間】においては、早期開通を目指し、現在「鏡田地区」「鹿子木地区」の工事を進めています。
- 本工事等の進み具合について、広く情報発信するため、『工事通信』にてご紹介していきます。

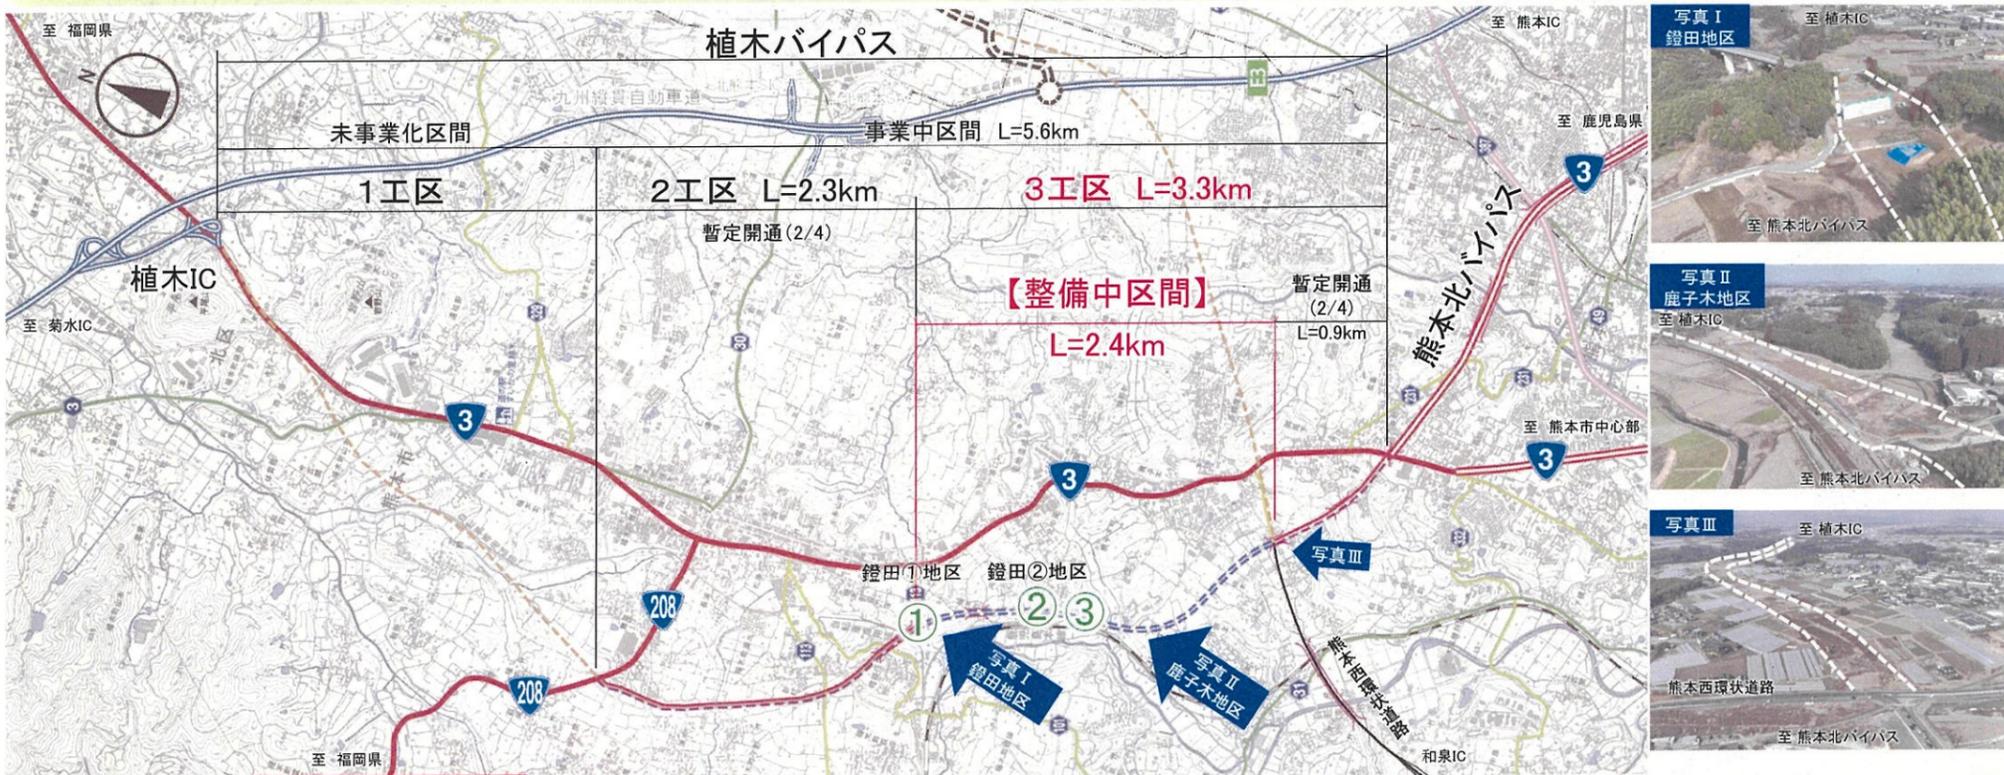

2月撮影ver.更新しました!

「熊本河川国道事務所のホームページ」や「下記のQRコード」から植木バイパス3工区(整備中区間)の進捗状況の映像を見ることが出来ます。



建設監督官
【神園 (かみその)】

【凡例】
1) 受注者名
2) 主な工事内容
3) 現在の工事状況

① 熊本3号鏡田地区改良6期工事 (R7.6.2~R8.3.27)

1) 三洲建設(株)
2) コンクリートボックスの設置
3) 場内整備・片付け

現場代理人の永友です。2月に足場解体が完了しました。3月で竣工となります。最後まで安全第一で努めてまいります。

② 熊本3号植木バイパス外改良(その3)工事 (R7.7.22~R8.3.31)

1) 諫山工業(株)
2) 地盤の改良
3) 土質改良・路体盛土・舗装

現場代理人の川元です。安全管理を徹底し、周辺環境に十分配慮しながら、3月の完成に向けて丁寧に取り組んでまいります。

③ 熊本3号鏡田地区改良7期工事 (R8.2.2~R8.9.18) **NEW**


1) (株)橋口組
2) 道路本体の切土・盛土
3) 除草・伐採等

監理技術者の池田です。3月より準備工(除草・伐採等)の作業を行います。工事完成まで安全第一で施工してまいります。



植木バイパス 3工区【整備中区間】

航空写真

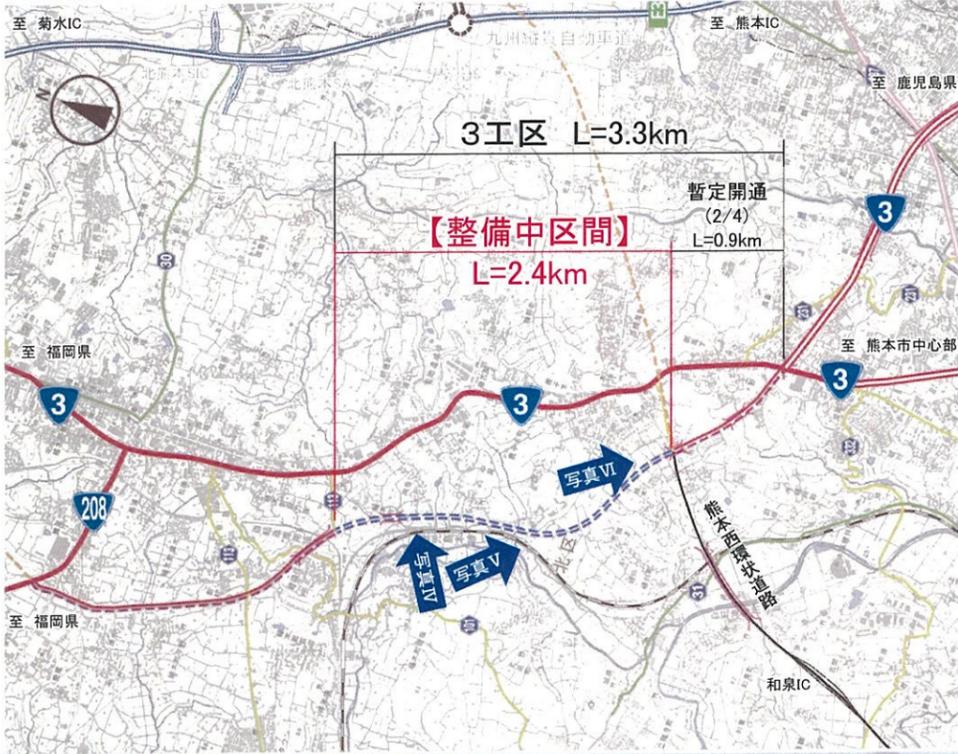

写真IV



写真V



写真VI




九州地方整備局 熊本河川国道事務所

あぶみだ

植木バイパス「鐙田地区」

- 鐙田①地区においては、市道の機能を確保するための**コンクリートボックス**の工事を進めています。
- 2月に足場を解体しました。今回の工事は3月で完了します。

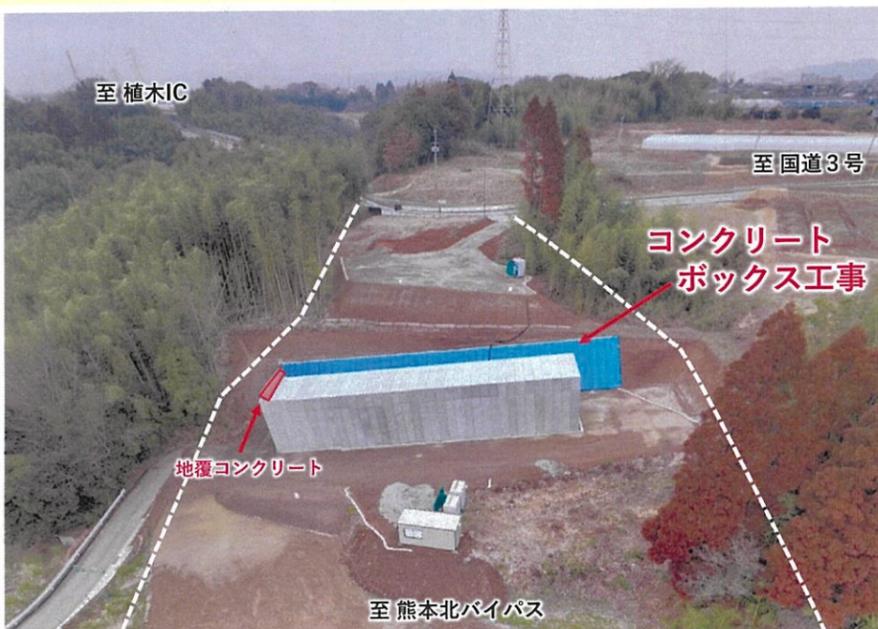

- 鐙田②地区においては、軟弱な土を土質改良しながら、**道路本体の盛土工事**を進めています。
- 今回の工事は3月で完了します。



現場で見つけた♡かわいい♡お花たち



センダンの実



オオイヌノフグリ



～今月の工事通信は、わたしが作成しました！～

九州地方整備局 熊本河川国道事務所 神園 (かみぞの) です。
 植木バイパス担当の建設監督官として仕事をしています。
 植木バイパスの1日も早い開通を目指してがんばっています！

