




九州地方整備局 熊本河川国道事務所

かのこぎ

植木バイパス「鹿子木地区」

- 鹿子木地区においては、**道路本体の盛土工事**とコンクリートボックスを施工するための**市道の迂回路工事**を進めています。
- 現在は、道路本体の盛土工事や市道迂回路の掘削工事などを行っています。

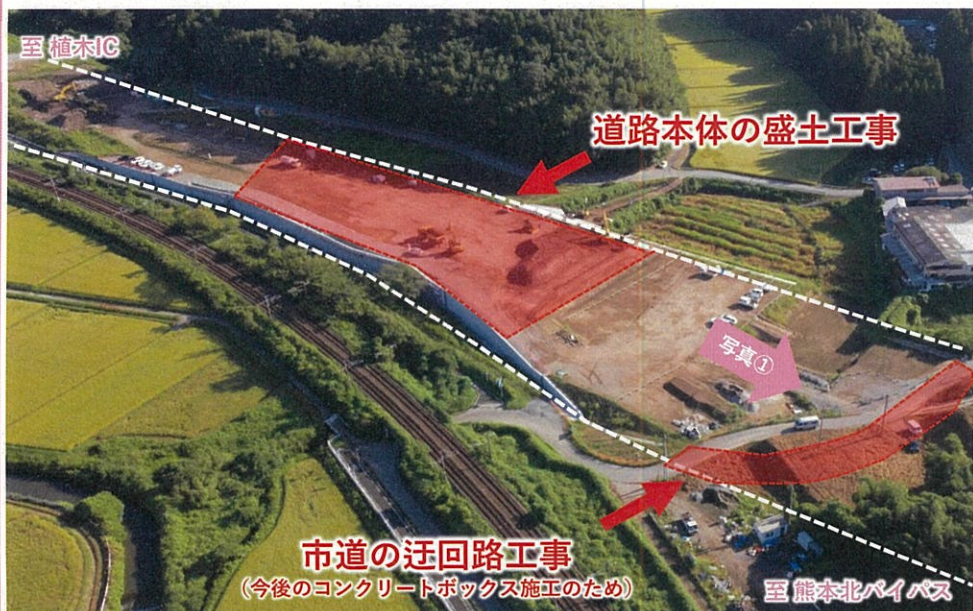

- 現地では市道迂回路の掘削工事に着手しました。
掘削した土はダンプトラックで運搬し、道路本体の盛土に使用しています。
- 排水構造物（側溝や集水軒など）の工事も進めています。若手技術者がベテラン技術者指導の下、側溝の高さを明示する丁張を設置していました。



現場に咲いていた♡かわいい♡お花たち



イモネノホシアサガオ



アキノノゲシ



ムラサキルエリア

～今月の工事通信は、わたしが作成しました！～

九州地方整備局 熊本河川国道事務所 神園（かみぞの）です。
今年の4月から植木バイパス担当の建設監督官として仕事をしています。
植木バイパスの1日も早い開通を目指してがんばっています！



国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所

国道3号 植木バイパス


工事通信



Vol.5

R7.11

- 地域の皆さまにおかれましては、日頃より「国道3号 植木バイパス」の工事にご協力いただき誠にありがとうございます。
- 植木バイパスの3工区【整備中區間】においては、早期開通を目指し、現在「**銚田地区**」「**鹿子木地区**」の工事を進めています。
- 本工事等の進み具合について、広く情報発信するため、『工事通信』にてご紹介していきます。

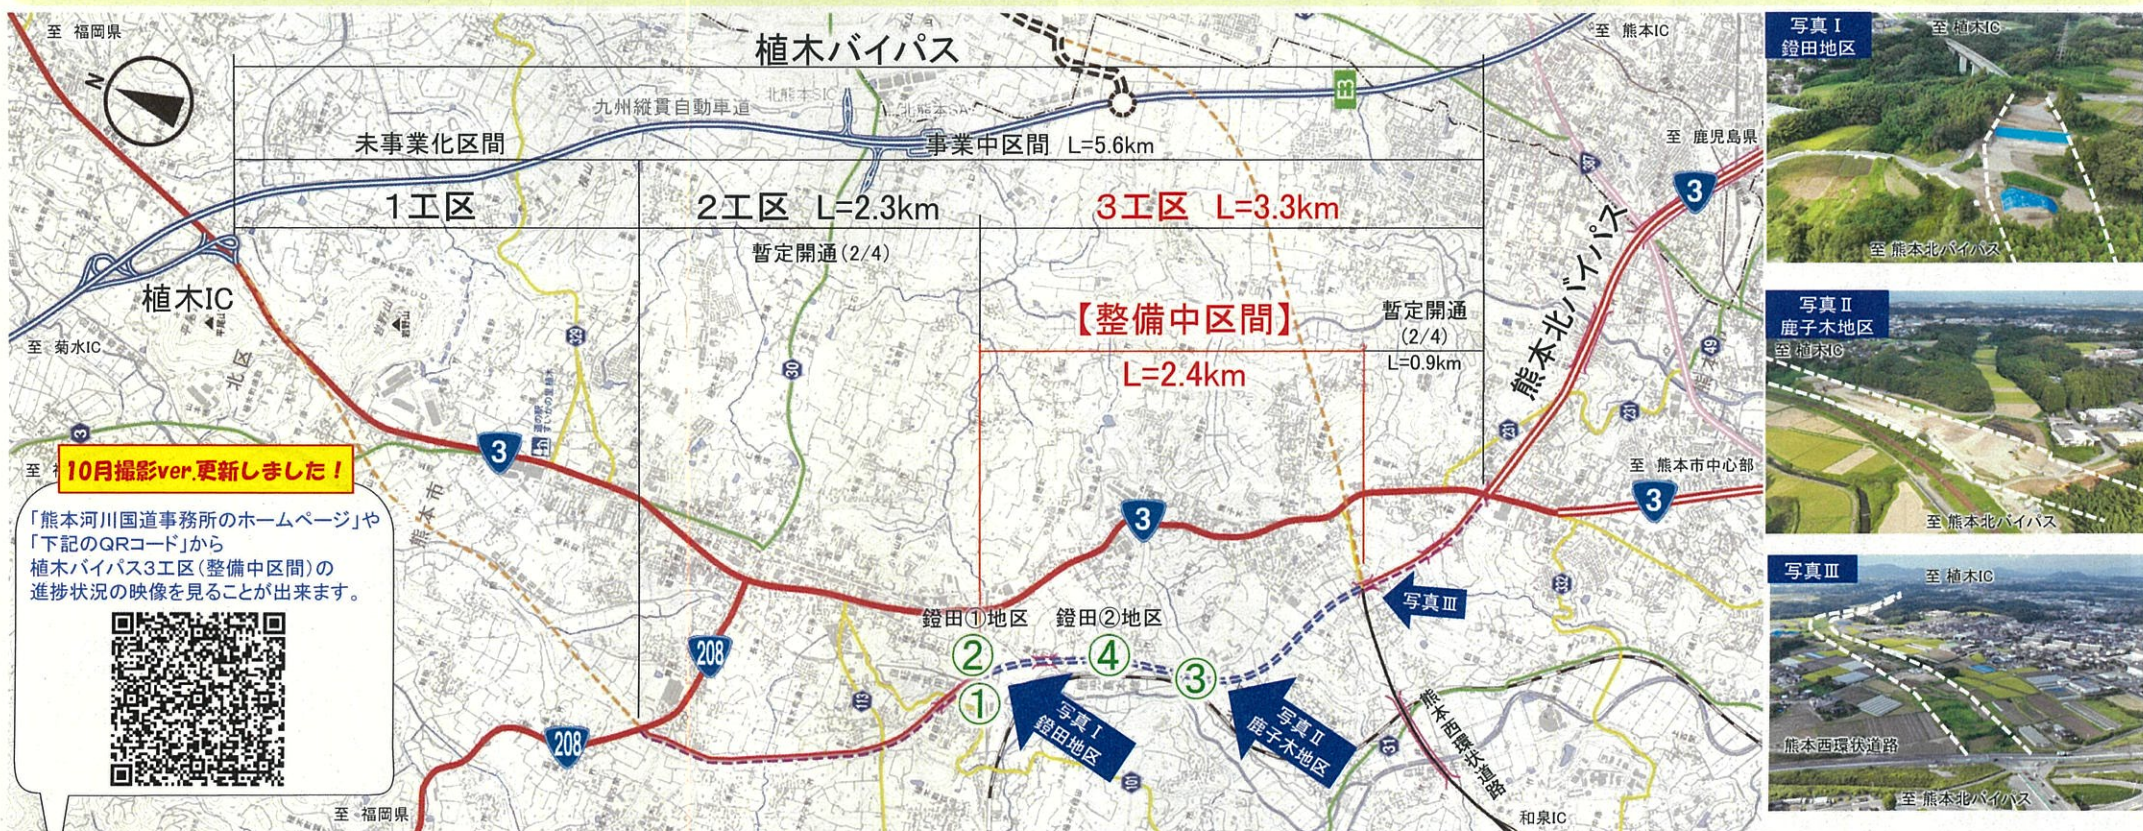

① 熊本3号 植木バイパス外改良 (その2) 工事 (R7.4.1～R8.2.27) 1) 五領建設(株) 2) 地盤の改良 3) 舗装工事 現場代理人の段原です。10月で地盤改良の施工が完了しました。今後は舗装工等を行います。引き続き安全第一で作業を進めています。 建設監督官 【神園（かみぞの）】 【凡例】 1) 受注者名 2) 主な工事内容 3) 現在の工事状況	② 熊本3号 銚田地区改良6期工事 (R7.6.2～R8.3.27) 1) 三洲建設(株) 2) コンクリートボックスの設置 3) コンクリートボックス設置準備 現場代理人の永友です。コンクリートボックスの工場製作が10月末で完了し、11月からは基礎コンクリート打設・足場設置を行う予定です。	③ 熊本3号 鹿子木地区改良7期工事 (R7.4.1～R8.2.27) 1) 興亜建設工業(株) 2) 地盤の改良、道路本体の盛土 3) 排水・路体盛土・迂回路掘削 現場代理人の松本です。11月は排水路と路体盛土と迂回路の掘削整形を行います。地元の方に迷惑が無いように安全第一で施工しています。	④ 熊本3号 植木バイパス外改良 (その3) 工事 (R7.7.22～R8.3.19) 1) 諫山工業(株) 2) 地盤の改良 3) 地盤の改良(銚田②地区) 現場代理人の川元です。11月も安全管理を徹底し、確実な施工で無事故完成を目指してまいります。よろしくお願いいたします！
--	--	---	---




植木バイパス 3工区【整備中区間】

航空写真



写真IV

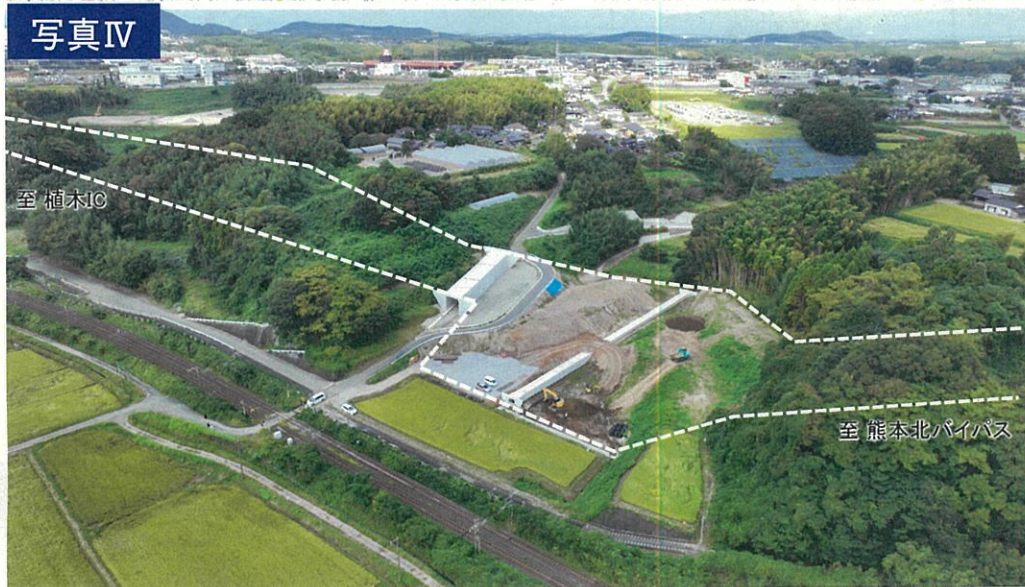

写真V



写真VI



埋蔵文化財調査の状況




埋蔵文化財調査の状況



九州地方整備局 熊本河川国道事務所 あぶみだ 植木バイパス「鐙田地区」


- 鐙田①地区においては、弱い地盤を強くする**地盤改良工事**と市道の機能を確保するための**コンクリートボックス**の工事を進めます。
- 現在は**地盤改良工事が完了**し、コンクリートボックスを設置する準備中です。

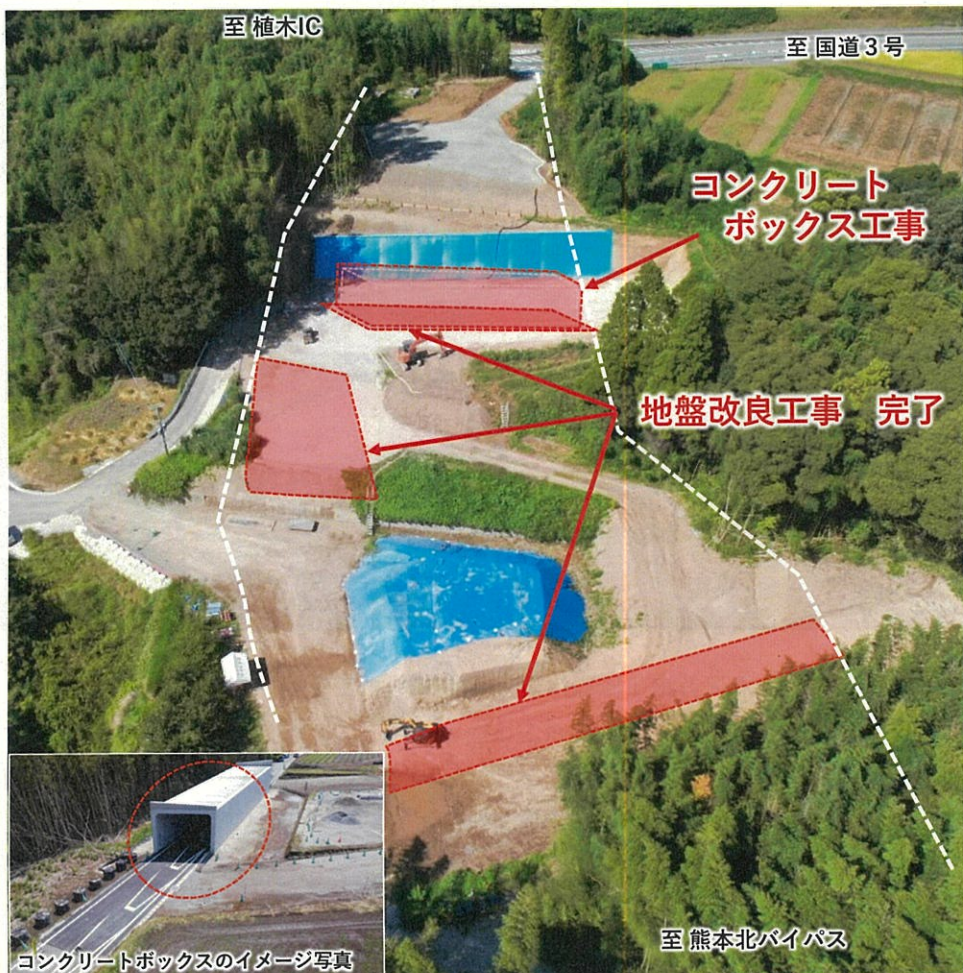

コンクリートボックスのイメージ写真

至 熊本北バイパス

- 鐙田②地区においては、弱い地盤を強くする**地盤改良工事**、**道路本体の盛土工事**及び市道ボックス部の**舗装工事**を進めます。
- 現在は、地盤改良工事を行っています。

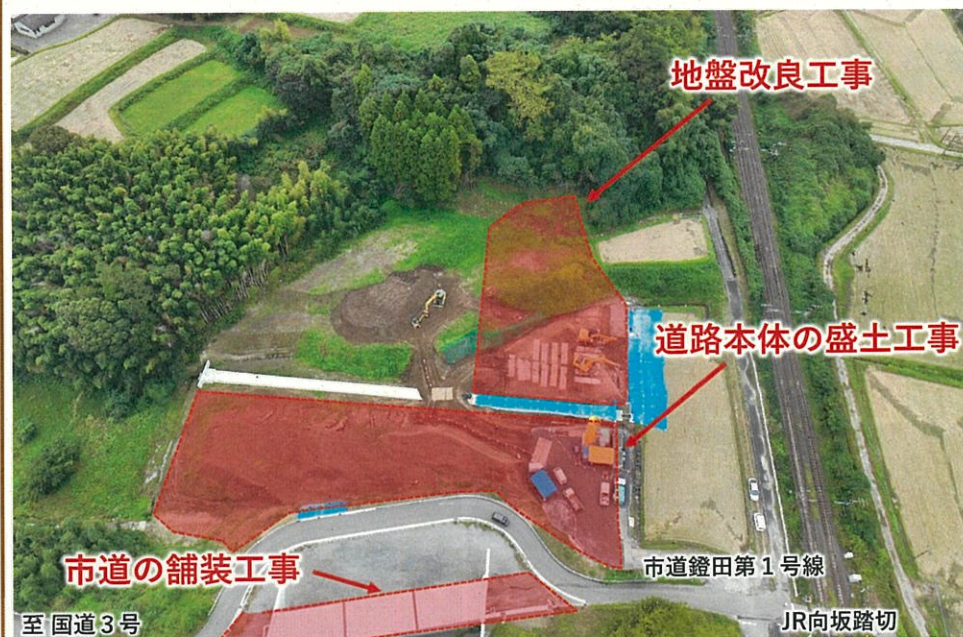

現場で見つけた♡かわいい♡もの

重機を支える敷鉄板には、吊り上げるための穴があいています



敷鉄板



何かの形に似てますよね



～今月の工事通信は、わたしが作成しました！～

九州地方整備局 熊本河川国道事務所 神園（かみぞの）です。
今年の4月から植木バイパス担当の建設監督官として仕事をしています。
植木バイパスの1日も早い開通を目指してがんばっています！

