

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	全国都市緑化フェアの開催による森の都の再生と震災からの復興（第2期）											
計画の期間	令和4年度（1年間）				交付対象		熊本市					
計画の目標												
水前寺江津湖公園の既存照明設備については、老朽化、水銀灯の仕様（LED未対応）、景観への配慮不足等もあり、LED化することで夜間景観の魅力向上及び安全性の確保を目的とする。 また、動植物園管理事務所内のトイレは、建設から37年経過し、経年劣化による老朽化が見受けられるため、洋式化及び内装改修を行うことにより、快適な施設を提供することを目的とする。												
計画の成果目標（定量的指標）												
・水前寺江津湖公園の利用者数の増加 ・街なかに緑が多いと感じる市民の割合の増加												
定量的指標の定義及び算定式									定量的指標の現況値及び目標値			備考
① ② ③ その他	① 水前寺江津湖公園を利用した人数							当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (R2末)	最終目標値 (R4末)		
	② 市民アンケートにより「街なかに緑が多いと感じる」市民の割合							115, 196人	116, 174人	116, 826人		
	③							67%	82. 0%	83%		
全体事業費		合計 (A + B + C)	139百万円	A	139百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C)	0. 0%	
事後評価												
○事後評価の実施体制、実施時期												
事後評価の実施体制							事後評価の実施時期					
熊本市公共事業評価監視委員会による審議							令和5年（2023年）10月					
							公表の方法					
							熊本市ホームページに掲載					

1. 交付対象事業の進捗状況																	
交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H31	R02	R03	R04	R05		
A12-001	公園	一般	熊本市	直接	熊本市			都市公園事業（水前寺江津湖公園）	園路・施設整備等（約126Ha）	熊本市				■		131.0	
A12-002	公園	一般	熊本市	直接	熊本市			都市公園事業（水前寺江津湖公園）	園路・施設整備等（約126ha）	熊本市				■		8.0	
合計																139	
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考
C 効果促進事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
合計																0.0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。


2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況					
II 定量的指標の達成状況	指標①	最終目標値	116,826人	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	149,144人		
	指標②	最終目標値	83%	目標値と実績値 に差が出た要因	R2よりアンケートの質問内容を「街なかに緑が多いと感じるか」から「中心市街地に緑が多いと感じるか」に変更したことにより、アーケード街などの建造物の密集したエリアを連想した回答が多くなり、該当年度より割合が急激に減少していると考えられる。（R1：73.3%→R2：58.3%） R2以降については割合が増加傾向にある。
		最終実績値	63%		
	指標③	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
	その他の指標	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項（今後の方針等）					

(参考図面)

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	全国都市緑化フェアの開催による森の都の再生と震災からの復興（第2期）		
計画の期間	和4年度（1年間）	交付対象	熊本市


水前寺江津湖公園

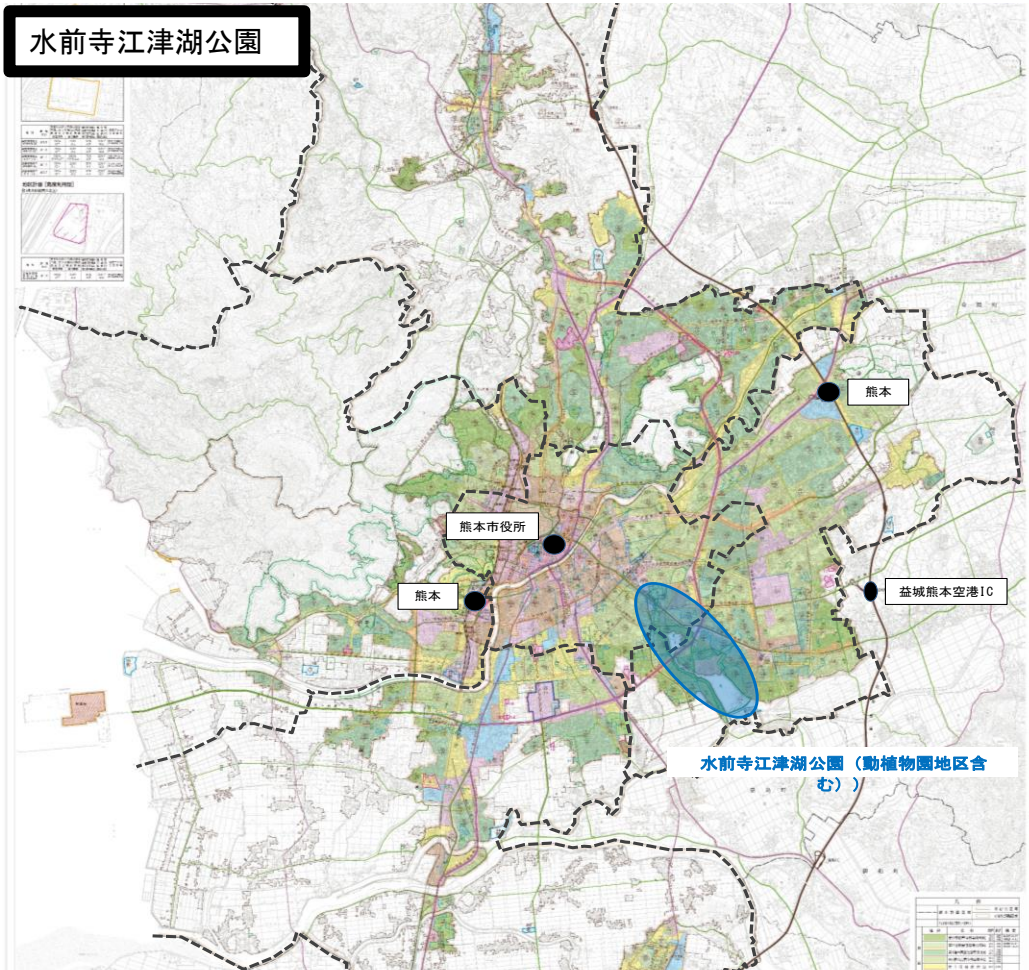

	要素事業名	R4要望
基幹事業	都市公園事業（水前寺江津湖公園）	○
	都市公園事業（熊本市動植物園）	○
	都市公園事業（熊本城公園（宮内地区））	—
	公園事業特定計画調査（熊本市緑の基本計画改定調査）	—
効果促進事業	普及啓発事業（全国都市緑化フェア推進事業）	—

熊本市動植物園

公園概要図（動植物園）

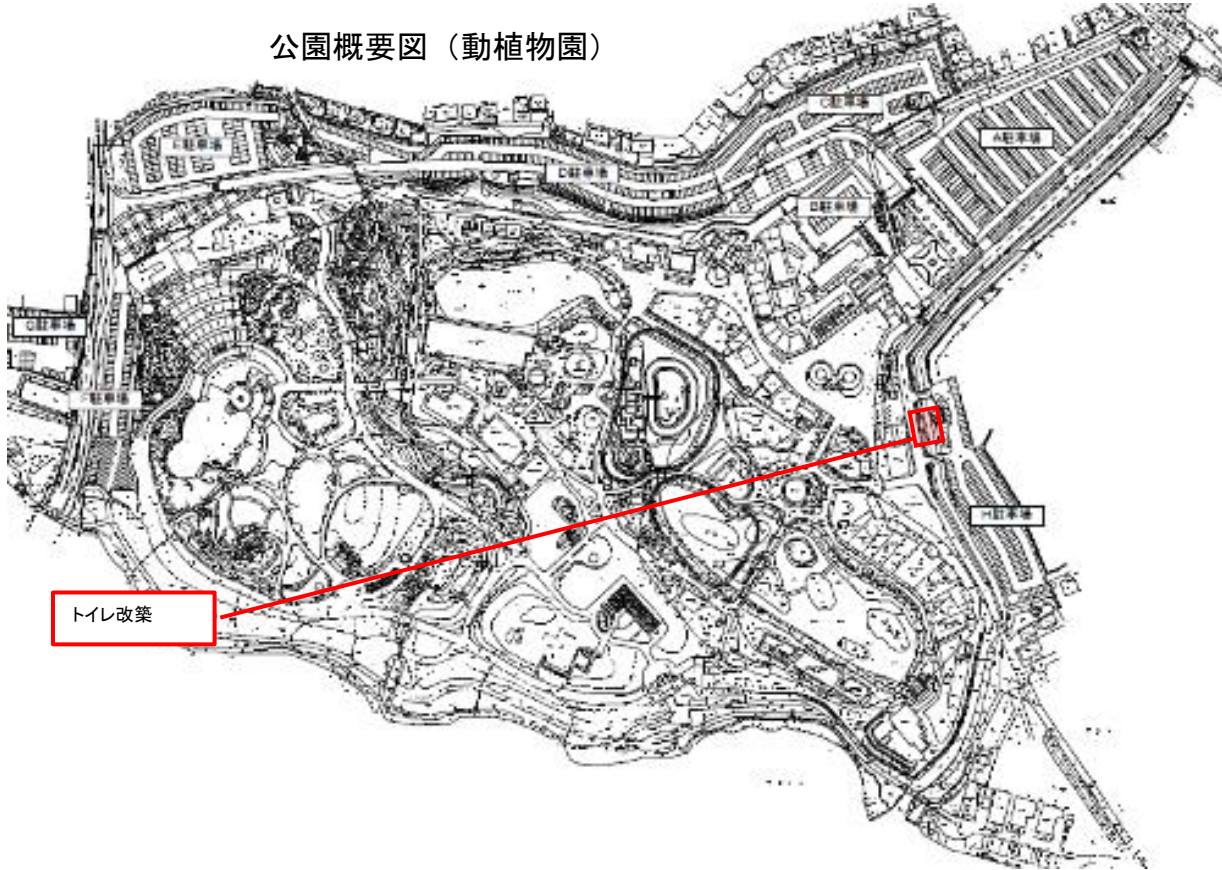

トイレ改築
