熊本城復旧取組状況について（平成30年度①）＜本丸地区＞

①西大手門周辺石垣回収及び西大手門・元太鼓櫓解体保存工事【H30・31事業】

西大手門

元太鼓櫓

②特別見学通路

・H30.3～H31.1月基本・実施設計

・H31.3.8　工事請負契約締結

③飯田丸五階櫓石垣復旧工事（継続）

・H30.7月～　石垣解体着手

【H30・31年度事業】

・H30.10月　構台解体完了

石垣解体状況1

石垣解体状2

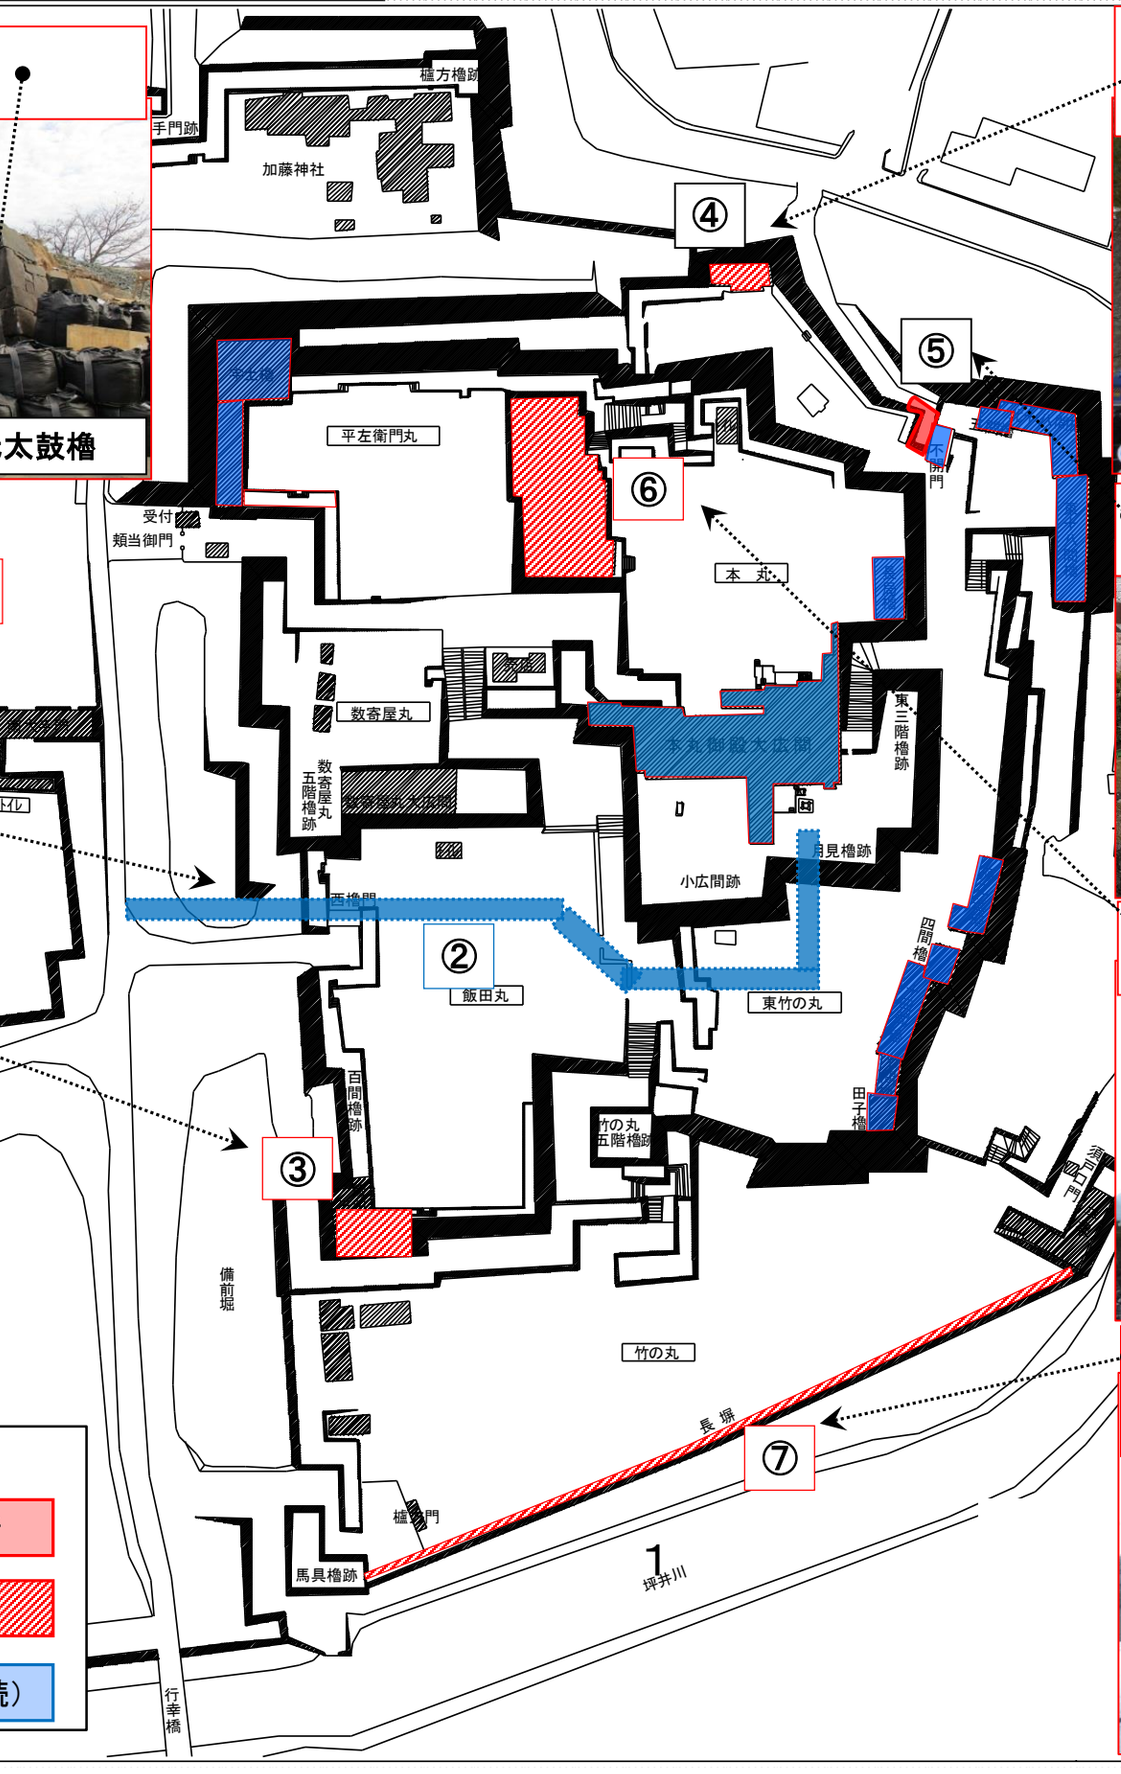

【 凡 例 】

- 工事完了箇所
- 工事中箇所
- 調査・設計（継続）

④平櫓解体保存工事

●・H30.7月着手【H30・31事業】

・H31.2月仮設構台設置完了

⑤不開門崩落石材回収外工事

●H30.7月着手（～H31.1月末完了）

⑥天守閣復旧整備工事【H28～32】

（継続：H31.3月上旬現在）

⑦長塀復旧工事【H30～32事業】

・H30.9月～追加遺構確認調査中

・H31.2.1　工事請負契約締結

熊本城復旧取組状況について（平成30年度②）＜本丸地区以外＞

旧細川刑部邸耐震診断及び修理設計業務委託

⑧旧細川刑部邸塀解体及び安全対策工事
H30.8月着手（～H30.11月完了）

塀解体完了

⑨二の丸御門跡崩落石垣回収工事
H30.2月着手（～H30.11月工事完了）

11/23より仮開通

⑩二の丸売店・休息所・トイレ・詰所解体工事
H30.12月着手（～H31.3月完了予定）

三の丸第2駐車場

熊本博物館
（H30年12月リニューアルオープン）

二の丸広場

⑪監物櫓解体保存工事
H30.9月着手（～H31.3月櫓解体完了予定）

別図（本丸地区）参照

二の丸料金所ほか８棟新築・改修設計
・H30.11月着手（～H31.3月下旬予定）

【 凡 例 】

- 工事完了箇所
- 工事中箇所
- 調査・設計（継続）
