8. 熊本駅周辺整備スケジュール

8－4　整備スケジュール

熊本駅周辺のまちづくりは、新幹線完成時（平成22年度）を当面の目標、在来線の高架化完了後（平成30頃）を将来目標とし、概ね以下のスケジュールで推進する。
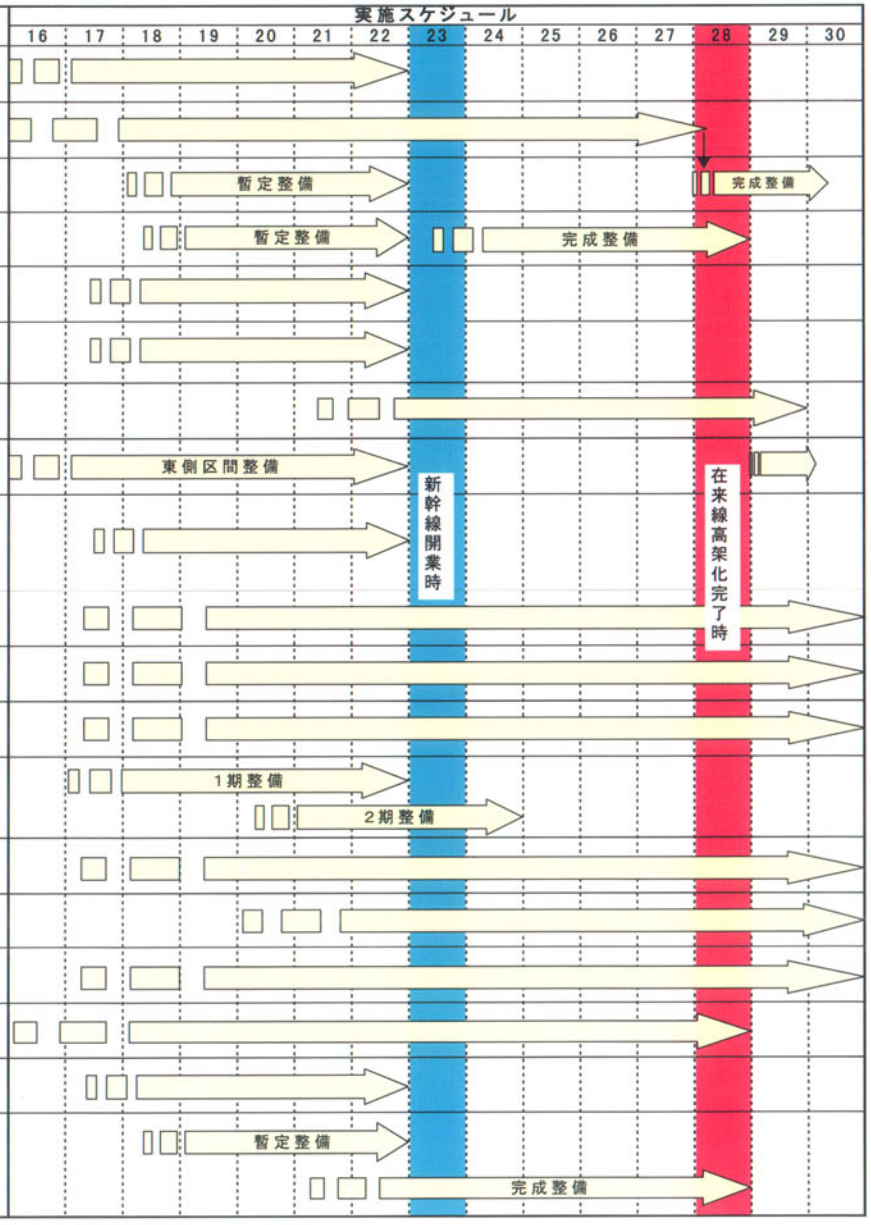
項　目	項目区分	実施主体	実施内容等
九州新幹線		鉄道・運輸機構	・博多～新八代　122km　熊本市域　15．6km
都市基盤	鉄道高架化	熊本県	・JR鹿児島本線　約6km ・豊肥本線約1km
	東口駅前広場	熊本県	・現在の面積9，600㎡を14，200㎡に拡張 ・南A交通広場（3，800㎡）
	春日池上線	熊本県	・区画整理区域外区間 ・幅員30m
	熊本駅新外線	熊本県	・幅員32m
	熊本駅城山線	熊本県	・駅～田崎橋　幅員36m ・市電のサイドリザベーション化（検討中）
			・田崎橋交差点～田崎春日線交差点　幅員30m
	熊本駅南線	熊本市	・幅員18m
東A地区	東A地区 市街地再開発	熊本市	・地区面積：1．4ha ・延床面積：約15，000㎡ ・（仮）熊本市図書・情報センター約8，000㎡ ・商業業務系施設等についても検討予定
	まちなみ形成	民間	・市街地整備計画に基づいた建築物等の整備
東B地区	まちなみ形成	民間	・市街地整備計画に基づいた建築物等の整備
南A地区	まちなみ形成	民間	・市街地整備計画に基づいた建築物等の整備
南B地区	合同庁舎移転	国	・敷地面積：約2．5ヘクタール ・総床面積：54,000㎡（A、Bの2棟計画） ・計14官署入居予定 ・人や環境にやさしい施設、魅力的な公共空間を創出
二本木A地区	まちなみ形成	民間	・市街地整備計画に基づいた建築物等の整備
	新しい 街路整備	熊本市	・幅員18m程度の都市計画道路を配置
北地区	まちなみ形成	民間	・市街地整備計画に基づいた建築物等の整備
駅西地区	土地区画整理	熊本市	・事業地区面積約18．1ha
	西口駅前広場	熊本市	・面積5，700㎡
	春日池上線	熊本市	・幅員30m
